Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Torrentz Filmes	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

	Controle de Versão					
Versão	Data	Autor	Nota da Versão			
1.0	29/10/2020	Marcos Paulo Paixão	Versão Inicial			
1.0	05/10/2020	Marcos Paulo Paixão	EAP, Principais Requisitos, Marcos, Partes interessadas do projeto, Restrições, Premissas, Riscos			

## Sumário

Objetivos deste documento	1
Situação atual e justificativa do projeto	1
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	1
Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	2
Principais requisitos das principais entregas/produtos	2
Marcos	2
Partes interessadas do projeto	2
Restrições	3
Premissas	3
Riscos	3
Orçamento do Projeto	3

# Objetivos deste documento

Autorizar e formalizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições agrupando todas as informações necessárias para a execução das atividades envolvidas.

# Situação atual e justificativa do projeto


A Torrentz Filmes deseja aperfeiçoar sua base de dados através de um software capaz de gerenciar os cadastro de usuários que podem contratar planos para o entretenimento com filmes de diversas categorias.

### Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

- Se o software seja concluído até 16 de novembro de 2020.
- Todos os requisitos descritos forem implementados.
- O aplicativo esteja em pleno funcionamento na data de apresentação para os stakeholders.

### Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

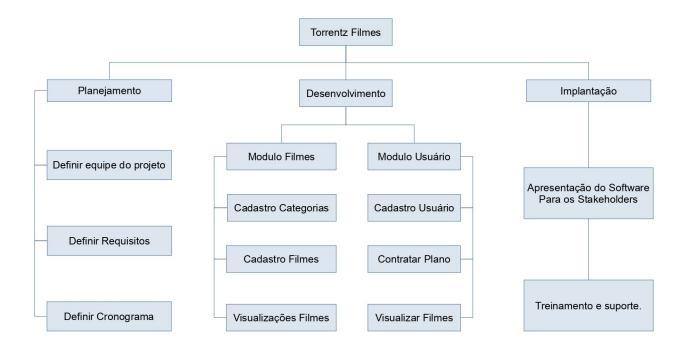

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

#### Segurança

- Login seguro para usuários e administradores do sistema.
- Possibilitar recuperação de senha.
- Armazenar os dados dos usuários de forma segura.

#### Usuários

- Usuário poderá visualizar na tela principal todos os filmes, categorias, planos e filmes que ele visualizou desde o seu cadastro.
- Possibilitar a alteração de algum dado do perfil com exceção do tipo de perfil se é administrador ou usuário.

#### Administrador

- ➤ Gestão de filmes, categorias, planos, usuários e contratos podendo cadastrar, alterar deletar, desde que, não destrua algum relacionamento entre entidades perdendo a integridade referencial.
- > Possibilitar o acesso as visualizações de todos os usuários aos filmes.

### Marcos

	Grupo de Processos	Marcos	Previsão	Início	Término	Predecessores
01	Iniciação	Torrentz Filmes				
02	Planejamento	Definir stakeholders, definir cronograma, definir requisitos	1 dia	23/10/20	23/10/20	01
03	Desenvolvimento	Módulo Administrador → Implementação do cadastro de Planos. Usuários e Contratos.	2 dias	26/10/20	27/10/20	01
04	Desenvolvimento	Módulo Administrador → Implementação do cadastro de Categorias. filmes e visualizações.	2 dias	28/10/20	29/10/20	02, 03
05	Desenvolvimento	Módulo Usuários → Implementação da funcionalidade visualizar filmes, alteração cadastral.	2 dias	30/10/20	01/11/20	04
06	Desenvolvimento	Módulo Segurança → Implementação tela de login funcionalidade redefinir senha.	3 dias	02/11/20	04/11/20	01
07	Teste	Teste por toda a equipe de desenvolvimento e Gerente de Desenvolvimento e correções de falhas.	4 dias	05/11/20	10/11/20	01 a 06
08	Implantação	Apresentação do Software Para os Stakeholders.	1 dia	11/11/20	11/11/20	07
09	Implantação	Treinamento e Suporte	1 dia	12/11/20	12/11/20	08

# Partes interessadas do projeto

Empresa	Empresa Participante Função		Responsabilidade	
Torrentz Filmes	Halley Wesley	Cliente	1 - Baixa	
Senai Fatesg	Heuber Lima	Gerente de Projetos	4 - Alto	
Fatesg Desenvolvimento	Vinicius Araujo Lopes	Gerente de Desenvolvimento	3 - Mediana	
Fatesg Desenvolvimento	Calebe Cabral da Costa	Programador	3 - Mediana	
Fatesg Desenvolvimento	Lucas A. Silva	Programador	3 - Mediana	
Fatesg Desenvolvimento	Marcos Paulo Paixão	Programador	3 - Mediana	

### Restrições

Não ultrapassar o orçamento previamente definido.

- Ninguém da equipe poderá fazer horas extras.
- Não poderá ultrapassar as datas impostas para conclusão de alguma entrega ou fase do projeto.
- Quando seu projeto é feito baseado em um contrato, algumas cláusulas contratuais
- > são restrições, pois, limitam o desempenho do projeto e devem ser cumpridas.

#### Premissas

- Membros da equipe que só podem trabalhar em determinado período como nos finais de semana ou em carga horária reduzida.
- Reunião com a equipe para avaliar o realizado, os próximos passos e os possíveis impedimentos.

#### Riscos

Descrição do Risco	Descrição do impacto	Ação	Descrição da Ação	Responsável	Previsão
Indisponibilidade de serviços de terceiros.	Interrupção momentânea das atividades.	Prevenir	Contratar redundância de serviços de terceiros e manter em segundo plano.	Marcos Paulo	Durante todo o projeto
Pausa no desenvolvimento devido algum defeito em máquina de produção.	Atraso na entrega de atividades de curto prazo.	Prevenir	Adquirir equipamentos sobressalentes para reposição durante a manutenção dos defeituosos.	Vinicius Lopes	Durante todo o projeto
Incidente ou problemas de saúde com algum colaborador, ocasionando a ausência do mesmo.	Impossibilidade de conclusão de entregáveis e projetos parciais	Prevenir	Realizar rodízio de funções de colaboradores no projeto, de forma que todos estejam habilitados para substituir o ausente	Heuber Lima	Durante todo o projeto

# Orçamento do Projeto
